


СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации
г. Мончегорска

В.И.Садчиков
« _____ » _____
2019 г.

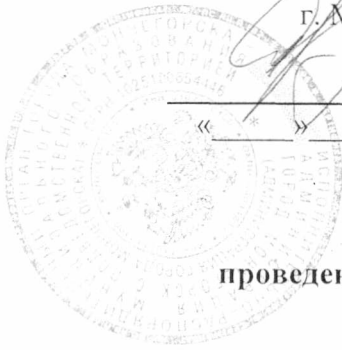

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «Мончегорская теплосеть»

В.В.Пасько
« _____ » _____
2019 г.



Программа

проведения пробных топок в н.п. 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья
перед началом отопительного периода 2019-2020 г.г.

Начало испытаний 08⁰⁰ час 29.08.19 г – окончание испытаний 16⁰⁰ час 02.09.19 г.

№ п/п	Начало работ	Окончание работ	Наименование операции или мероприятия	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	29.08.2019г 8 ⁰⁰ час	29.08.2019г 8 ³⁰ час	Сбор состава бригад и постановка задач на период проведения пробных топок	АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Алексеев С.В.
2.	29.08.2019г 9 ⁰⁰ час	30.08.2019г 11 ⁰⁰ час	Обход тепловой сети, камер. Внешний осмотр запорной арматуры, дренажей и воздушников. Определение работоспособности и исправности арматуры. Проверка на закрытие и открытие запорной арматуры на тепловой сети. Внешний осмотр запорной арматуры. Определение работоспособности и исправности арматуры. Проверка на закрытие и открытие запорной арматуры на тепловых вводах МКД.	АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Алексеев С.В. ООО «Альтернатива», директор Смирнов Л.В.
4.	30.08.2019г 11 ⁰⁰ час	30.08.2019г 12 ⁰⁰ час	Открывается вводная арматура (подающая и обратная линии) на тепловых узлах МКД. Вводная арматура (подающая и обратная линии) на тепловом узле МБДОУ №19 должна быть в открытом положении.	ООО «Альтернатива», директор Смирнов Л.В., МБДОУ №19, ответственный за энергоустановки.
5.	30.08.2019г 12 ⁰⁰ час	02.09.2019г 12 ⁰⁰ час	Начинается прогрев внутренних систем отопления МКД. Температура теплоносителя поддерживается в соответствии с температурным графиком. Котельная: Расход теплоносителя не более -30,0 м ³ /час Давление на выходе котла - 3,5-4,0 кгс/см ² Температура теплоносителя – 39 ⁰ С	АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Алексеев С.В., бригадир котельной Коваленко С.А.

			<p>Проверка качества работы и круглосуточный контроль за работой системы теплоснабжения</p> <p>Проверка на прогрев и регулирование внутридомовых систем отопления по стоякам и этажам.</p> <p>Проверка качества работы систем теплоснабжения и круглосуточный контроль за работой систем отопления.</p>	<p>АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Алексеев С.В. Бригадир котельной Коваленко С.А.</p> <p>ООО «Альтернатива», директор Смирнов Л.В.</p>
5.	02.09.2019г 12 ⁰⁰ час	02.09.2019г 16 ⁰⁰ час	<p>Программа считается законченной. Восстанавливаем первоначальную схему теплоснабжения для работы в летний период. Восстановить летний режим теплоснабжения</p> <p>Закреть запорную арматуру на подающей и обратной линиях систем отопления МКД</p> <p>Теплоснабжение МБДОУ №19 организовать по зимнему режиму</p>	<p>АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Алексеев С.В., бригадир котельной Коваленко С.А.</p> <p>ООО «Альтернатива», директор Смирнов Л.В. АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Алексеев С.В., бригадир котельной Коваленко С.А.</p>
6.	03.09.2019г 9 ⁰⁰ час		<p>Составляются акты на проведение пробных топок с указанием обнаруженных дефектов оборудования котельной и тепловой сети, обнаруженных дефектов работы систем отопления МКД.</p>	<p>ООО «Альтернатива», директор Смирнов Л.В. АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Алексеев С.В., бригадир котельной Коваленко С.А.</p>

Согласовано:

Директор
МКУ «УЖКХ г. Мончегорска»





Т.В. Кузнецова

Директор ООО «Альтернатива»

Л.В. Смирнов
